

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001

DATA DE INÍCIO: 11/11/2022
DATA DE TÉRMINO: 13/02/2023
DATA ELABORAÇÃO: 13/02/2023

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico, nas Ruas Manoel Bezerra de Lima, Travessa Cristina de Carvalho, Rua Padre Olímpio de Souza e Travessa São Miguel, localizadas no Município de Gravata/PE



Esta Medição	Valor Acumulado Medido:	Saldo do Contrato:	Valor do Contrato:
R\$ 64.141,97	R\$ 64.141,97	R\$ 148.351,81	R\$ 212.493,78

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

Processo Licitatório: 026/2022
Tomada de Preços: 006/2022
Contrato: 116/2022
BDI: 20,09%
Prazo de execução: 3 (três) meses

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 212.493,78
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 0,00
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 64.141,97
VALOR ACUMULADO:	R\$ 64.141,97
PERCENTUAL REALIZADO:	30,19%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 148.351,81

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
3.0			RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA				212.493,78		-		64.141,97		64.141,97		148.351,81
3.1			TERRAPLENAGEM												
3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	R\$ 2,87	1184,40	R\$ 3.399,23		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1184,40	R\$ 3.399,23
3.2			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
3.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	R\$ 52,58	592,20	R\$ 31.137,88		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	592,20	R\$ 31.137,88
3.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	R\$ 74,89	1184,40	R\$ 88.699,72		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1184,40	R\$ 88.699,72
3.2.3	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	R\$ 97,30	210,00	R\$ 20.433,00		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	210,00	R\$ 20.433,00
3.3			SINALIZAÇÃO												
3.3.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 24 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 224,27	8,00	R\$ 1.794,16		R\$ -	8,00	R\$ 1.794,16	8,00	R\$ 1.794,16	0,00	R\$ 0,00
3.3.2	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	R\$ 74,00	1,00	R\$ 74,00		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 74,00
4.0			RUA CRISTINA CARVALHO												
4.1			TERRAPLENAGEM												
4.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	R\$ 2,87	156,00	R\$ 447,72		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	156,00	R\$ 447,72
4.2			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
4.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	R\$ 52,58	78,00	R\$ 4.101,24		R\$ -	78,00	R\$ 4.101,24	78,00	R\$ 4.101,24	0,00	R\$ 0,00
4.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	R\$ 74,89	156,00	R\$ 11.682,84		R\$ -	156,00	R\$ 11.682,84	156,00	R\$ 11.682,84	0,00	R\$ 0,00
4.3			SINALIZAÇÃO												
4.3.1	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	R\$ 74,00	1,00	R\$ 74,00		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 74,00
5.0			RUA PADRE OLÍMPIO DE SOUZA												
5.1			TERRAPLENAGEM												
5.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	R\$ 2,87	211,50	R\$ 607,01		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	211,50	R\$ 607,01
5.2			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
5.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	R\$ 52,58	90,00	R\$ 4.732,20		R\$ -	90,00	R\$ 4.732,20	90,00	R\$ 4.732,20	0,00	R\$ 0,00

Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.02.14 10:17:15 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001

DATA DE INÍCIO: 11/11/2022
DATA DE TÉRMINO: 13/02/2023
DATA ELABORAÇÃO: 13/02/2023

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico, nas Ruas Manoel Bezerra de Lima, Travessa Cristina de Carvalho, Rua Padre Olímpio de Souza e Travessa São Miguel, localizadas no Município de Gravata/PE

Esta Medição	Valor Acumulado Medido:	Saldo do Contrato:	Valor do Contrato:
R\$ 64.141,97	R\$ 64.141,97	R\$ 148.351,81	R\$ 212.493,78



Processo Licitatório: 026/2022
Tomada de Preços: 006/2022
Contrato: 116/2022
BDI: 20,09%
Prazo de execução: 3 (três) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 212.493,78
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 0,00
VALOR DO BOLETIM	R\$ 64.141,97
VALOR ACUMULADO	R\$ 64.141,97
PERCENTUAL REALIZADO:	30,19%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 148.351,81

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
5.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	M2	R\$ 74,89	211,50	R\$ 15.839,24		R\$ -	211,50	R\$ 15.839,24	211,50	R\$ 15.839,24	0,00	R\$ 0,00
5.3			SINALIZAÇÃO												
5.3.1	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	R\$ 74,00	1,00	R\$ 74,00		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 74,00
6.0			TRAVESSA SÃO MIGUEL												
6.1			TERRAPLENAGEM												
6.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	R\$ 2,87	261,80	R\$ 751,37		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	261,80	R\$ 751,37
6.1.2	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE AF 03/2021	M3	R\$ 173,73	5,00	R\$ 868,65		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 868,65
6.2			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
6.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	R\$ 52,58	154,00	R\$ 8.097,32		R\$ -	154,00	R\$ 8.097,32	154,00	R\$ 8.097,32	0,00	R\$ 0,00
6.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	M2	R\$ 74,89	261,80	R\$ 19.606,20		R\$ -	238,95	R\$ 17.894,97	238,95	R\$ 17.894,97	22,85	R\$ 1.711,23
6.3			SINALIZAÇÃO												
6.3.1	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	R\$ 74,00	1,00	R\$ 74,00		R\$ -		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 74,00
TOTAIS							212.493,78		-		64.141,97		64.141,97		148.351,81


Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.02.14 10:17:38 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS: RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, RUA CRISTINA CARVALHO, RUA PADRE OLÍMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

DATA: março / 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANALÍTICA

IT	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MEDIDAS										TOTAL
					A	V	P	C	L	H/E	DMT	QTDE	FATOR		
2 RUA CRISTINA CARVALHO															
2.2 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM															
2.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M				39,00				2,00		78,00	
														78,00	
2.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2				39,00	4,00					156,00	
														156,00	
3 RUA PADRE OLÍMPIO DE SOUZA															
3.2 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM															
3.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M				45,00				2,00		90,00	
														90,00	
3.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2				45,00	4,70					211,50	
														211,50	
4 TRAVESSA SÃO MIGUEL															
4.2 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM															
4.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M				77,00				2,00		154,00	
														154,00	
4.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2				70,28	3,40					238,95	
														238,95	

Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351
487

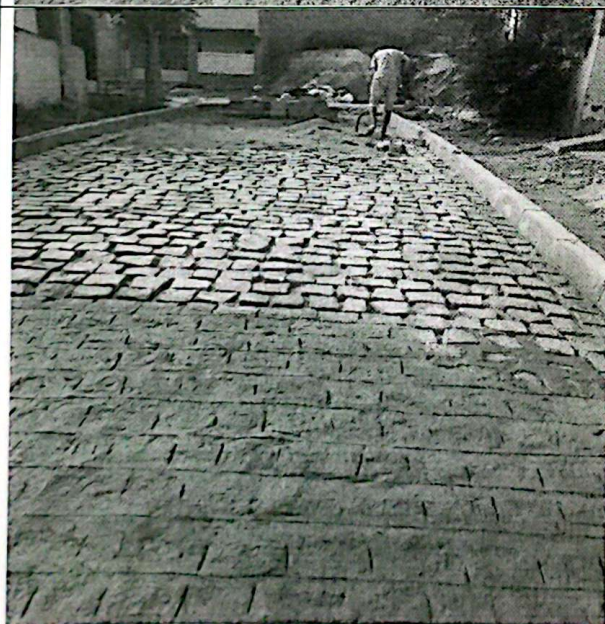
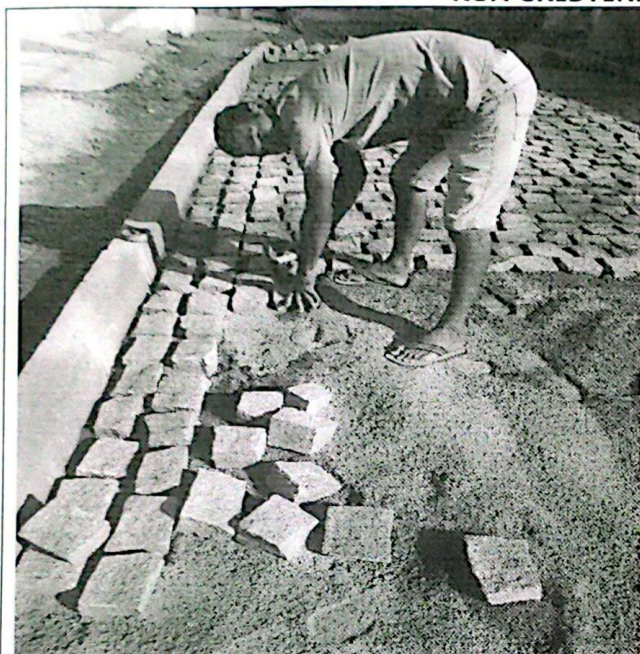
Assinado de forma digital
por LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.02.14
10:17:57 -03'00'

Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NAS RUAS MANOEL BEZERRA DE LIMA, CRISTINA CARVALHO, PADRE OLÍMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, localizadas no emunípio de Gravatá/PE.

**RIO BRANCO** Construtora**GRAVATÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

RUA CRISTINA CARVALHO

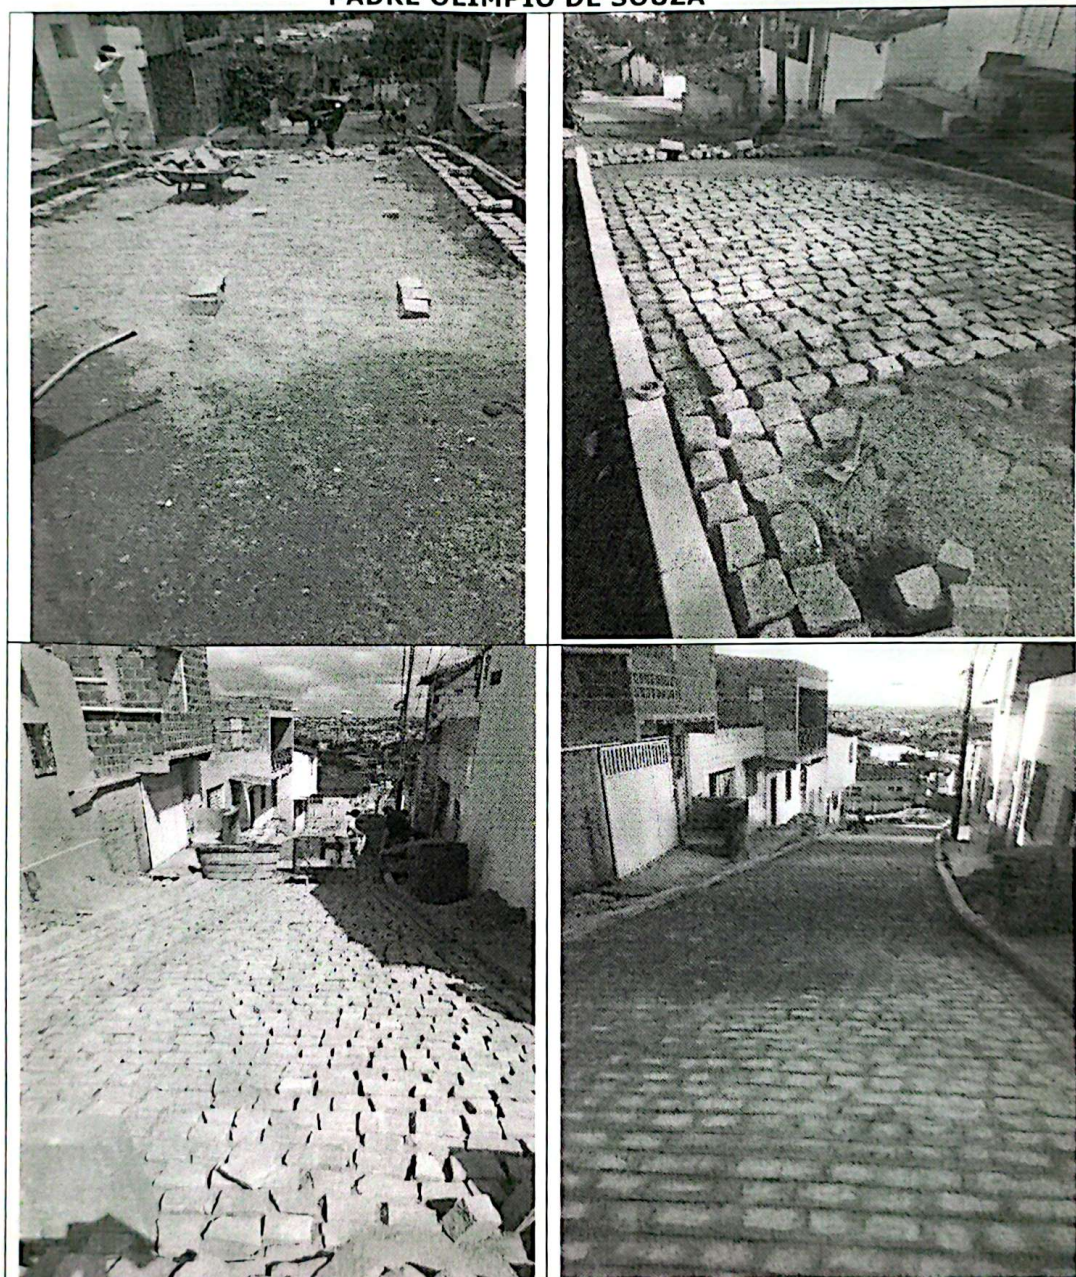
Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.02.14 09:25:20
+03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	BM 01
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NAS RUAS MANOEL BEZERRA DE LIMA, CRISTINA CARVALHO, PADRE OLÍMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, localizadas no emunícípio de Gravatá/PE.		
 RIO BRANCO Construtora	 GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS	

PADRE OLÍMPIO DE SOUZA



Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

LUIZ AMÉRICO DE
 MIRANDA
 JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2023.02.14 09:25:42
 +03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	BM 01
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NAS RUAS MANOEL BEZERRA DE LIMA, CRISTINA CARVALHO, PADRE OLÍMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, localizadas no emunícípio de Gravatá/PE.		
 RIO BRANCO Construtora	 GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS	

TRAVESSA SÃO MIGUEL



Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE
 MIRANDA
 JUNIOR:415893514
 87

Assinado de forma digital
 por LUIZ AMERICO DE
 MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2023.02.14 09:26:02
 -03'00'
